



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS



EVALUACIÓN EX-POST DEL PROYECTO “FAMILIAS FORTALECEN SU SOBERANIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL CON SISTEMA PRODUCTIVOS RESILIENTES E INCLUYENTES EN EL MUNICIPIO DEL CONGO”

Responsable:

Lic. Roberto Carlos Martínez Batres

Asistencia técnica:

Mtro. Walter Antonio Fagoaga

Santa Ana, marzo 2018

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	3
INTRODUCCIÓN.....	4
ANTECEDENTES	5
Propósito y finalidad de la evaluación.....	5
Objetivo de la evaluación	5
Metodología de la evaluación.....	5
CONTEXTO DEL PROYECTO.....	6
Objetivo del proyecto	6
Componentes del proyecto	6
Resultados esperando del proyecto.....	6
RESULTADOS SEGÚN INDICADORES DE EVALUACIÓN	7
Pertinencia de la acciones ejecutadas	8
Eficiencia en el uso de recursos.....	11
Eficacia de las acciones del proyecto	13
Impacto del proyecto	16
Viabilidad y sostenibilidad del proyecto	21
LECCIONES APRENDIDAS	24
CONCLUSIONES.....	25
RECOMENDACIONES	27
ANEXOS	28

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo general de la evaluación es realizar una evaluación externa al finalizar la ejecución del proyecto con el propósito de medir la actuación y los resultados obtenidos con la realización de las actividades del proyecto, identificando elementos positivos y mejorables ligados a la ejecución, haciendo un especial énfasis en la escalabilidad y sostenibilidad de los procesos establecidos.

Para tales efectos, se trabajó con una metodología de “Diagnóstico Evaluativo Rural y Participativo”, consistente en técnicas cualitativas para recopilar información de los actores claves del proyecto y así con la evidencia documental, triangular y valorar los resultados de las acciones, con base a los indicadores de

En cuanto a los resultados de la evaluación, considerando los indicadores se puede mencionar, a saber:

- La pertinencia es evidenciada, debido a que el proyecto atendió una necesidad sentida en la población y acorde a sus requerimientos de asistencia técnica.
- La eficacia se valoró de forma adecuada, en vista que el uso de los recursos suplió los componentes del proyecto y permitió desarrollar las acciones proyectadas.
- La eficiencia se consideró coherente, porque los componentes del proyecto si implicaron repercusiones en las diversas acciones del entorno comunitario, estableciéndose una relación directa entre lo planificado y lo ejecutado.
- Con respecto al impacto, se puede decir que es evidente en la medida que se logró identificar los cambios que han ocurrido en las comunidades y en todo el entorno, además, de la formulación de una política municipal de seguridad alimentaria que será un instrumento importante para el seguimiento y desarrollo del municipio de El Congo.
- La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se puede mencionar que es acertada, ya que se mostró que existen condiciones y capacidades que han sido instaladas por el proyecto para su continuidad, con los grupos de voluntarios y la organización comunitaria esbozada en las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS)

INTRODUCCIÓN

El cambio climático como un fenómeno global esta generando diversos cambios en cuanto a la forma en que se organizaba diversos rubros de la vida humana, siendo una de estos la producción agrícola, la cual se ve afectada directamente por los efectos provocados por esta amenaza global.

La afectación en la producción agrícola tiene una incidencia pavorosa en los productores, particularmente en aquellos quienes no tiene acceso a tecnologías de punta que les permita afrontar esta situación, conllevando a su total abandono y a poner en riesgos sus seguridad alimentaria, porque buen porcentaje de quienes producen la tierra, lo hacen para subsistir con sus hogares.

Los efectos del calentamiento global traen consigo escenarios apocalípticos, donde el hambre, los conflictos sociales, entre otros; se convertirán en el menor plazo posible es hechos que se estarán transmitiendo en diversos medios de comunicación social.

Ante estas situaciones la Fundación Ayuda en Acción, a través del financiamiento del Gobierno del Principado de Asturias, ha llevado a cabo el proyecto “*familias fortalecen su soberanía alimentaria nutricional con sistema productivos resilientes e incluyentes en el municipio del Congo*”, el cual consistió en generar con diversos componente, mecanismo resilientes para afrontar los efectos del cambio climático y fortalecer las capacidades productivas y de atención en salud y nutrición de cuatro comunidades rurales.

En ese marco, el presente documento contiene la evaluación externa de esta acción, en la cual se describen a partir de indicadores de impacto, como se valoró desde la miradas de los participantes y la revisión de documentación, los resultados que se generaron a partir de la instalación del proyecto en cuestión.

Por ello en breve, se muestra dicha evaluación la cual muestra una construcción de la perspectiva del impacto que tuvo este proyecto en la población y los territorios de las cuatro comunidades involucradas en estas acciones.

ANTECEDENTES

La ONG Fundación Ayuda en Acción - Programa Nacional El Salvador, con el financiamiento de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y el Gobierno del Principado de Asturias, ha implementado durante el año 2017 el proyecto “Familias rurales fortalecen su soberanía y seguridad alimentaria nutricional con sistemas productivos resilientes e incluyentes en el municipio de El Congo, El Salvador”.

Propósito y finalidad de la evaluación

Realizar una evaluación externa implica básicamente establecer un componente de trabajo que posibilita un marco de mejora para cualquier acción.

Objetivo de la evaluación

Realizar una evaluación externa al finalizar la ejecución del proyecto con el propósito de medir la actuación y los resultados obtenidos con la realización de las actividades del proyecto, identificando elementos positivos y mejorables ligados a la ejecución, haciendo un especial énfasis en la escalabilidad y sostenibilidad de los procesos establecidos.

Metodología de la evaluación

Para llevar a cabo esta evaluación se consideró una metodología basada en un “Diagnóstico Evaluativo Rural Participativo” (DERP), que consiste en el empleo de técnicas participativas de tipo cualitativas, para recopilar la información necesaria para la evaluación, con los actores claves que se vieron involucrados en el proyecto, a fin de vincular las acciones y sus resultados.

En este sentido, se realizaron cinco grupos focales, cuatro con participantes de las comunidades beneficiadas por el proyecto y el otro, con el equipo técnico que ejecutó las acciones; además, se giraron entrevistas a líderes de las comunidades; y por último, se recopilaron los medios de verificación más significativos para efectos de triangular la información y así evidenciar los resultados e impactos del proyecto en las comunidades beneficiarias durante la ejecución de la acción.

CONTEXTO DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto

Mejorar la seguridad alimentaria nutricional de las familias de 4 comunidades de forma ambiental, social, cultural y económicamente sostenible.

Componentes del proyecto

El proyecto estuvo esbozado a partir de tres componentes, los cuales son:

- 1) Familias en riesgo de inseguridad alimentaria medios de vida resilientes que mejoran su disponibilidad y acceso físico y económico a alimentos nutritivos y diversificados.
- 2) Familias, cuentan con las capacidades técnicas para mejorar condiciones de salud familiar con énfasis en salud nutricional y desarrollo de la primera infancia con enfoque de género.
- 3) El Gobierno municipal de El Congo formula y valida su política de seguridad alimentaria y nutricional desde una perspectiva de género, fomentado la investigación e innovación tecnológica para la producción de alimentos y seguimiento nutricional

Resultados esperando del proyecto

El proyecto tenía, considerando sus componente, tres resultados principales que son:

Resultado 1: Ciento noventa familias en riesgo de inseguridad alimentaria de 4 comunidades del municipio del Congo, cuentan con medios de vida resilientes que mejoran su disponibilidad y acceso físico y económico a alimentos nutritivos y diversificados.

Resultado 2: 125 Familias, 36 lideresas y líderes de 4 comunidades y 12 funcionarios y técnicos de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar, cuentan con las capacidades técnicas para mejorar condiciones de salud familiar con énfasis en salud nutricional y desarrollo de la primera infancia con enfoque de género.

Resultado 3: El Gobierno municipal de El Congo formula y valida su política de seguridad alimentaria y nutricional desde una perspectiva de género, fomentado la investigación e innovación tecnológica para la producción de alimentos y seguimiento nutricional.

Territorios y escenarios del proyecto

El proyecto se llevó a cabo en cuatro comunidades pertenecientes al municipio del Congo, en el departamento de Santa Ana, siendo estas:

- El Rodeo
- La Presa
- El Rosario
- La Laguna

Todas con características rurales y con poblaciones cuya fuente principal de ingresos es la agricultura. En el caso de la Laguna, no tiene una vocación vinculada al tema agrícola, porque el espacio para la producción es mínimo, así que la dedicación al tema pesquero y la crianza de animales es más recurrente.

Unidad ejecutara del proyecto: Fundación Ayuda en Acción ADT Ilamatepec.

Organismo financiata: Gobierno del Principado de Asturias.

RESULTADOS SEGÚN INDICADORES DE EVALUACIÓN

Para realizar la evaluación externa del proyecto, se ha determinado una serie de indicadores de impacto, con los cuales se ha consultado tanto fuentes primarias como secundarias para poder establecer los cambios sustantivos y aquellos aspectos que muestran como esta acción contribuyó al desarrollo de estas comunidades y sus habitantes.

Pertinencia de la acciones ejecutadas

La pertinencia tiene que ver con la adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en donde se realizó la acción, para ello se buscó identificar con los actores claves, que tanto el proyecto era necesario realizarlo en su territorio.

Grupo focal comunidades

“Ayuda en acción ha sido un pilar fundamental para nosotros porque nos ha traído cambios a nuestra comunidad para nuestros niños y nosotros las mujeres, con el trabajo de los técnicos, son proyectos que si nos han ayudado mucho en la salud la niña Emilia con cuidar mejor a nuestros, don Armando con los módulos y capacitaciones para poder producir más para que mejore nuestra economía familiar, también el taller de recursos artesanales para mejorar el bienestar de las mujeres para poder desenvolvemos por nosotras mismas y no depender de la pareja” (Comunidad La Laguna)


“Fue de una gran ayuda, más porque aquí casi no hay trabajo, con lo que nos dan ayudan a las familias bastante, todo lo que trajo la Lic. Emilia, yo en el proyecto de los granos básicos, de ahí me hice consejera voluntaria. Se ve que esta ayuda se es muy adecuada porque a bastantes personas han ayudado”.
(Comunidad La Presa)

Fueron 4 licenciados los encargados de plantearnos el proyecto y de ahí empezamos, nos enseñaron como tallar, pesar, niños desnutridos, algo nuevo para nosotros y al final ya podemos hacerlo. (Comunidad El Rodeo)

Aquí en nuestra comunidad hay una gran necesidad, antes que ellos vinieran no sentíamos mucho apoyo, pero ahora con eso de los huertos, la atención en salud y las semillas, nos sentimos apoyados, ha sido oportuno que ellos hayan venido aquí. (Comunidad El Rosario)

Como puede evidenciarse en las consideraciones de las y los participantes en los grupos focales de las comunidades participantes, se palpa una necesidad que fue correspondida por la ejecución del proyecto, denotando un alto nivel de pertinencia en cuanto a la acción. En cuanto a los liderazgos locales, también coincidieron al entrevistarse.

Entrevistas líderes de la comunidad

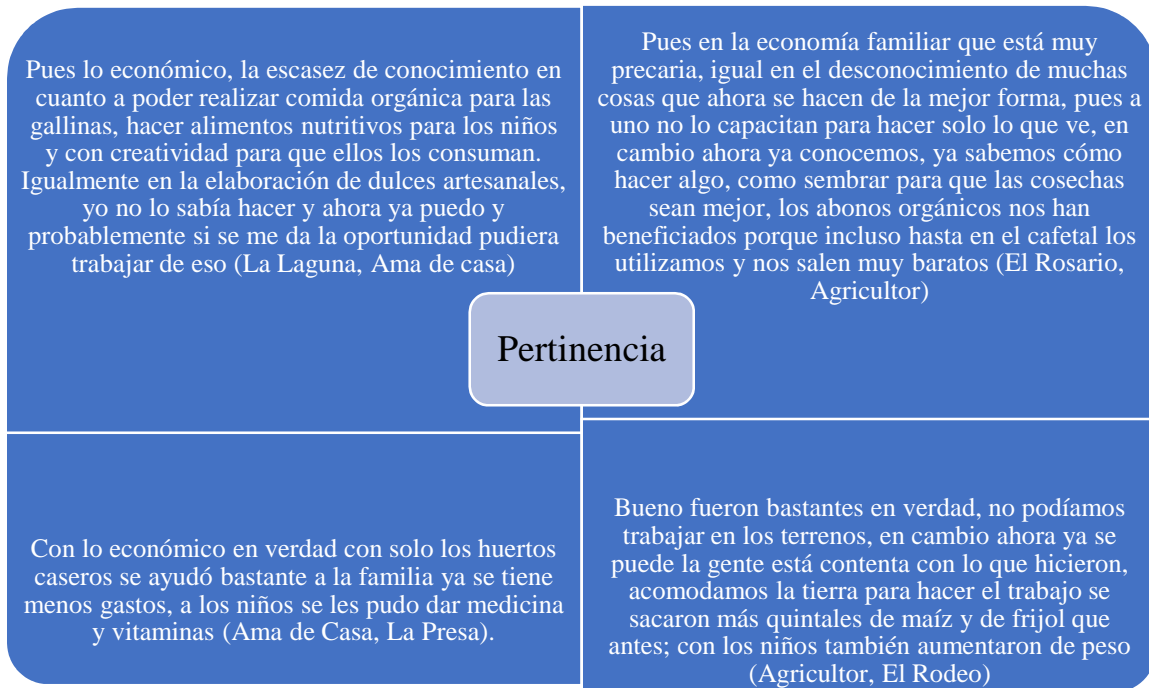

Con respecto al liderazgo comunitario, también refirieron en cuanto a la pertinencia del proyecto, particularmente en cuanto a la necesidades con las cuales afrontaron la acción. Uno de los puntos donde se destaca es el tema de economía familiar. Para los entrevistados, el punto de vista más relevante se encuentra en ese tópico, sin embargo, también entre el tema de salud, ya que en ambos encontraron un apoyo oportuno por parte de la organización, que les permitió mejorar sus práctica agrícola, pero también su calidad de vida en cuanto a la salud familias, con énfasis en la niñez y las mujeres.

Al consultar al responsable de la Coordinador de la unidad de gestión de riesgos de la alcaldía municipal del Congo, mencionó que el proyecto era oportuno: “*Se trata de implementar, una educación para hacerles ver lo importante del trabajo que están haciendo y que vale la pena, que ellos mismos sepan administrarlo, no hacer lo que se hace porque lo que se cosecha cada familia es lo más nutritivo que puede haber y cambiar ese tipo de alimentación*”, con esto específico la necesidad que se tenía en cuanto a integrar alrededor de una política municipal, los aspectos relacionados con el tema de la acción para el tema agrícola, pero también con respecto a la salud y nutrición de la población.

Grupo focal al equipo técnico

En el caso del tema de seguridad alimentaria se observó una carencia de técnicas necesarias para que la gente produjera, no necesitaban tierras, a partir de nuestra línea de base se logró observar que hacía falta la tecnología para ayudar en la producción y un seguimiento apropiado para mejorar sus actividades, con el trabajo que hemos hecho se ha logrado hacer esos pasos.

En el caso de la salud y nutrición haiga posibilidad del ministerio de darles algunos medicamentos y nutrientes era algo que no se daba así, las familias no tenían conocimiento que ayuda les darían esos medicamentos, hicimos un balance de niveles de nutrición en todas las áreas y teníamos registrados 88 casos de desnutrición

Históricamente, las poblaciones con las que trabajamos han sido marginadas, era un municipio marcado por la hacienda a la gente se le prohibía cultivar, aparte de que los gobiernos central y municipal no tenían interés en la agricultura ahí, más la roya, más la sequilla eran una serie de problemas que generaron la desnutrición, poca producción dependencia a productos externos el proyecto vino a inyectar un poco de vitalidad a la comunidad.

El equipo técnico del proyecto evidenció el estado de la comunidad desde diversas perspectiva considerando los componentes del proyecto, con lo cual se denota en buena parte, la necesidades comunitarias, pero además la relación entre las acciones ejecutada y el entorno, además de la integración del gobierno municipal y actores gubernamentales, donde no se habría tenido una sinergia completa en el pasado.

En el caso del componente de seguridad alimentaria y agricultura, se destaca que las los miembros de la comunidad no tenían un conocimiento de técnicas agroecológicas con las cuales poder llevar a cabo sus labores agrícolas, siendo una mención importante destacadas durante la evaluación por las personas beneficiadas.

En el caso del componente de salud, de igual forma el tema nutricional es destacado por el equipo técnico de forma puntual, destacando la situación de la niñez con respecto a la desnutrición, que aunque en cifras oficiales no sean presentado así, en el territorio esta situación desvela otra realidad, la cual es de atención y que este proyecto, con sus componentes le dio prioridad.

Eficiencia en el uso de recursos

La eficiencia se considera como la medida del logro de los resultados en relación con los recursos empleados, buscándose la combinación óptima de recursos financieros, materiales, técnicos, naturales y humanos para maximizar resultados.

En este sentido, se abordó con los participantes del proyecto el tipo de recursos que se tuvieron durante la acción, destacándose los aportes que se percibieron.

Grupo focal a comunidades



El proyecto, en sí, consistió en entregar material para hacer un módulo, para mantener las gallinas que entregaron, 18 gallinas criollas (Comunidad El Rodeo).



El proyecto nos trajo varios recursos de apoyo a la comunidad, con los cuales hoy nos sentimos agradecidos, solo con eso de la semilla es un gran beneficio para toda la gente (Comunidad La Presa)



Nosotros aquí siempre nos hemos sentido abandonados, pero con estas ayudas hemos logrado mejorar nuestras vidas, aquí es difícil, pero ya con estos nos sentimos motivados (Comunidad El Rosario)



Las gallinas que nos dieron fueron de un gran apoyo, no solo porque podemos alimentarnos mejor, sino porque hasta hemos ayudado a otras personas, también la salud es bueno (Comunidad La Laguna)

Las comunidades al consultarse sobre los recursos ofrecieron una información relevante, sobre todo porque destacan la utilización de éstos como parte de un aporte a la comunidad y una forma de entrelazar la mejora de sus condiciones de vida con la oportunidad de desarrollo en el entorno.

Cada comunidad destacó de forma importante el tema agrícola, pero también lo concerniente a la salud, ya que en ambos valoraron la importancia que tuvieron los recursos implementados para la mejora de la calidad de vida de las familias, sobre todo por el manejo óptimo de éstos para poder implementar las acciones más relevantes.

Un componente importante del proyecto estuvo relacionado con la entrega de insumos al establecimiento de salud, donde el aporte fue valorar significativamente por responsable del área de enfermería que expresó:

Durante el proyecto recibimos de parte Ayuda en Acción una dotación importante de equipos e insumos para atender de forma más oportuna a las comunidades, entre estos nos entregaron estetoscopios, plumones, impresoras multifunción, linterna, básculas, desparasitantes, nutrientes, aporte con el transporte que fue fundamental para acceder a las comunidades.

Jefatura de enfermería de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar del municipio del Congo

Como se evidencia, por parte de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar del municipio del Congo, se logra evidencia que existió un importante aporte con relación a la dotación de insumos y equipamiento para la atención más extensiva e hicieron una mención especial, en el tema del transporte, ya que esto posibilitó que la cobertura fuera más efectiva para atender las necesidades de la personas y las comunidades, de tal manera que se pudiera hacer efectivo las atenciones y el desplazamiento de los recursos humanos de salud.

Al consultar al equipo técnico con relación a los recursos valoraron de forma importante lo desarrollado, pero también sus limitaciones.

Grupo focal equipo técnico del proyecto

Yo considero que es bien considerado y es bien complicado poder que desarrolle estos proyectos al 100% de lo planificado, si hubo un buen funcionamiento de los recursos, en el ámbito del proceso se utilizaran una medida para enfocarnos en los más importantes, esto ocasiono que se diera un pequeño retraso y esto ocasiono que el proceso fuera más lento porque el resultado fue poco en poco.

Para el equipo técnico, los recursos fueron proporcionado adecuadamente y su utilización fue efectiva adecuadamente, sobre todo porque se suplió el 100% de las necesidades sobre las cuales se hizo la planificación, además, aunque existieron procesos de atraso, no alteraron el tiempo en el que se planificó las acciones cumpliendo eficientemente con las actividades programas según el cronograma y tiempo estimado para ello.

Eficacia de las acciones del proyecto

La eficacia se entiendo como el grado o nivel de alcance de los objetivos y resultados del proyecto sobre la población beneficiaria y en un período temporal determinado, sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos.

La eficacia se puede considerar como la medida del grado o nivel de alcance de los objetivos y resultados del proyecto sobre la población beneficiaria y en un período temporal determinado, sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos.

En sentido, con este indicador se ha busca que establezca como los objetivos proyectados se ejecutaron y generaron resultados positivos a la población considerando el tiempo de la ejecución de la acción.

Grupo focal comunidades participantes (Componente seguridad alimentaria y medios de vida resilientes)

Mi experiencia en el proyecto en como uno puede ponerle soluciones a los problemas de la sociedad, como yo aportar al proceso gracias a las capacitaciones, aprendí a hacer el abono orgánico, los alimentos antes no tenían una duración adecuada, este nos impulsó y animó a seguir adelante en el camino, más acompañada con unos ahorros de dinero (Comunidad La Presa)

El beneficio que han tenido las familias con este proyecto es un poco más de alimentación para la familia, aparte de algunas monedas de más por lo de la gallina que se pone en crianza se obtiene dinero cuando las vendés (Comunidad La Laguna)

En lo agrícola, fue desarrollándose en la entrega de semillas para cultivos y abono, se enseñó hacer barreras vivas y muertas para el terreno de cultivo, como poder hacerlo (Comunidad el Rodeo)

Ayuda en acción nos trajo conocimientos parar mejorar sus prácticas agrícolas, para que no dañemos las tierras y nuestras cosechas no se vean afectadas en el futuro (Comunidad El Rosario)

Al considerar las opiniones de los participantes, se muestra que la opinión de éstos con respecto a la situación de la seguridad alimentaria, particularmente en la generación de una producción agrícola y avícola, ha sido eficaz en cuanto se ha tomado conciencia de la necesidad prácticas agrícolas que puedan permitir ser resilientes al cambio climático, además, de mejorar su abastecimiento y comercialización de sus granos básicos.

Grupo focal comunidades participantes (componente de salud y nutrición)

Para toda mi familia fue de gran ayuda este proyecto más porque mi hijo salió de bajo peso, la Lic. Emilia nos dio vitaminas, pañales, cereal para el niño. Luego llego al proyecto de las plantas, con este mi esposo y yo trabajamos esto ha sido de gran ayuda para todo lo básico (Comunidad La Presa)

En la salud, en la atención y desarrollo de ellos, la niña Emilia ha tenido cuidado varias veces en las tallas y peso de los niños si uno de los niños pierde peso ella está viendo que hacer para que lo vuelva a ganar, las capacitaciones que nos ha dado para saber cómo ayudar a las demás, hemos aprendido a trabajar unidos, el proyecto en la comunidad ha ido en beneficio en beneficio (Comunidad La Laguna)

Se atención muy bien a las mujeres embarazadas y a los niños a ambos se les dieron vitaminas, se les dieron productos para su desarrollo y para su cuidado, fue de gran ayuda que se allá implementado y esperamos que siga (Comunidad El Rodeo)

En cuanto a la salud fue muy bueno porque los niños recibieron atención y además se le dio micronutrientes. Pienso que esta ayuda ha sido muy buena para nosotros y para nuestro hijos, esperamos que más adelante se pueda continuar con esto (Comunidad El Rosario).

Con relación al componente de salud, en los grupos focales de las diversas comunidades se pudo evidenciar que si fue existió eficacia en cuenta a la mejorar de la atención en salud de las personas, que manifestaron a partir de sus opiniones, aportes significativos para la salud familiar.

Se debe decir, que el componente de salud estuvo acuerpado no sólo por la atención directa, sino por la **búsqueda de prácticas de promoción y prevención de salud**, esto en función de buscar la adecuación de las acciones hacia la mejora del entorno, pero también para prevenir enfermedades y sobre todo, la desnutrición, ya que al articular los esfuerzo tanto del componente uno como el dos, el resultados conlleva a mejorar el cuidado de la alimentación a través, de una mejorar alimentaria que beneficie la nutrición y desarrollo pleno de comunidad, particularmente de la niñez y las mujeres en estado de embarazo, que permite garantizar el derecho humano a la salud a dicha población.

Impacto del proyecto

Consiste en el análisis de todo posible efecto o consecuencia de la intervención en el territorio. Debe tenerse en cuenta que no se limita a revisar el alcance de los efectos previstos y deseados y tampoco se reduce al estudio de dichos efectos sobre la población beneficiaria, sino a como se percibe una relación entre el antes y después de la acción.

Con respecto a este indicador, es importante señalarlo como uno de vital importancia, porque permite desvelar, los efectos de la intervención y por lo tanto, valorar cual ha sido el aporte significativo del proyecto. Para analizar tal situación, se plantearán los tres componentes a los cuales se atendió durante la intervención.

Impactos del componente seguridad alimentaria y medios de vida resilientes (Entrevistas a Líderes)

En lo económico porque con lo que nos regalaron uno ya no se preocupa y puede enfocarse en otras áreas para ayudar a la familia en lo agrícola con el aumento de la cosecha de los granos y esto da más ganancia (Líder comunitaria y Ama de casa, comunidad El Rodeo)

En lo personal, me beneficio bastante con los nuevos conocimientos y gracia a hacer voluntaria ya se puede trabajar con la comunidad, también como poder sembrar hortalizas cuando se debe de plantar y cuando cosechar, como hacer el veneno orgánico, en verdad a mi si me ayudaron mucho (Líder y ama de casa, comunidad La Presa).

Pues mejoró mis conocimientos en cuanto a hacer abono orgánico, nos ahorramos mucho dinero ya no comprando tanto abono o venenos químicos. Y ese dinero lo utilizamos para otras cosas básicas. Estos abonos orgánicos ayudan al medio ambiente, no perjudican como los químicos, al medio y a nosotros, los otros venenos pueden intoxicar a alguien, matarlo, estos sí, pero no es tanto como los venenos químicos. entonces cuidan la salud (Líder y ama de casa, comunidad La Laguna).

Mire con este proyecto pudimos mejorar lo que hacíamos. Antes quemábamos las tierra para cultivar y no sabíamos que estábamos arruinándola, además, muchos químicos utilizábamos, con este nos afectaba la salud, en cambio ahora viera, que ya con lo que nos enseñaron no solo se hace la cosas bien, sino que mejor. Más salud y mejores productos. (Líder y agricultor, comunidad El Rosario)

Los beneficiarios del proyecto en este primer componente, consideran que el principal impacto que han recibido es el tema económico, ya que con las nuevas técnicas de agroecología y el manejo de un banco de semillas, han logrado reducir sus costos de

producción, con lo cual se ven beneficiados no sólo porque producen más, sino también porque en el tiempo sus tierras no se verán afectadas con los derivados de los químicos que tradicionalmente empleaban, ni las técnicas de quemar antes de sembrar.

La relación dialéctica que se construye a partir de este impacto es importante, ya que en términos cualitativos, una mejora en la producción también conlleva a una mejora en cuanto a sus medios de vida, porque además, el proyecto conllevó a la entrega de silos metálicos, con los cuales también el almacenamiento fue fundamental y también provocó que estos granos se conserven, permitiéndoles de una forma más sustantiva garantizar que durante el año tengan reservas de granos.

Cabe mencionar también, que aunque no fue mencionado con precisión, pero también hicieron la mención que la comercialización de sus granos también mejoró en algunos casos, aunque todavía es una materia pendiente este ciclo de trabajo.

Por otra parte, también la introducción de hortalizas propició una mejora en cuanto a la producción, más aún con nuevas técnicas de producción, de las cuales les permitieron tener la posibilidad, de producir sin quedarse sin la cosecha, ya que aprendieron como afrontar un cultivo adecuado.

Durante las entrevistas y los grupos focales, también mencionaron que con este proyecto se habría dado un importante giro a la producción agrícola, ya que con las nuevas prácticas que se tienen, se puede emplazar esfuerzos para el futuro y así, poder garantizar el progreso de la comunidad.

Por otra parte, también en referencia al tema del cambio climático, se evidenció que existe una conciencia sobre este tema, algo que expresaron algunos líderes así:

“El cambio climático es algo que nos afectará a todos, aunque no todos somos responsables, pero eso no nos evita que hagamos algo por nosotros mismos, y creo que lo que ha hecho ayuda en acción es prepararnos para afrontar este problema que ya nos está afectando... la lluvia ya no llega como antes y los cultivos se caen, pero creo que con este apoyo, vamos a enfrentar esto y sobrevivir” (Líder y agricultor, comunidad El Rosario).

La mención de este líder da cuenta de la importancia que ha tenido particularmente para las personas que forman parte de los beneficiados de esta acción, el tener mecanismos alternativos para la producción agrícola, algo que no solo les permiten tener una mejora de sus ingresos – como ha sido señalado anteriormente-, sino construir una puente para que en el futuro el fenómeno del cambio climático no ensordezca sus posibilidades de desarrollo, algo que se ha comenzado a concientizar en estos grupos, quienes se vieron beneficiados con la acción.

Al revisar los medios de verificación del proyecto, está claro que el trabajo realizado en cuanto a la mejora de la calidad de vida la población ha sido significativo, y al consultar con el equipo técnico se hacía la siguiente mención, a saber:

Grupo focal con equipo técnico

Este fue un impacto en el modo de utilizar las semillas, el banco de semilla les da el acceso para que ellos a cualquier tiempo del año pueda conseguir la semilla para sembrar, este es regulado por la misma comunidad, pero ahora se busca que trabaje no solo los que están siendo beneficiados ahora sino que toda la comunidad.

En el tema de la agricultura se logró que la gente produzca con menor costo, generar un cambio en la dinámica en el manejo de ecológico de los suelos, de los insumos, esto no solo para que la gente gaste menos, sino para que ellos coman más sanos y utilizar menos los recursos no renovables.

En la zona de la laguna, fue otro modo de hacer el proyecto ya que ahí la gente no tenía tierras para poder cultivar, así que el proyecto se enfocó en hacer que la gente tuviera gallinas en sus casas para producir huevos, ellos tenían ya gallinas pero lo tenían en un modo tradicional la gallina ande suelta y se la puede robar, comer los animales, la gente solo la tenían solo para vender, les llevamos gallinas criollas para mantenerlas encerradas las alimentábamos con concentrado orgánico reducimos los costos en la ambientación de los animales, reducimos el riesgo de pérdida de la familia porque se las coman los animales. Fue un impacto en desarrollar a la gente en las actividades que ellos hacían antes, y generar ingresos.

Según lo planteado por el equipo técnico del proyecto, los cambios operados generaron una transformación de la forma en que realizaban prácticas agrícolas, algo que ya se habría evidenciado en los testimonios de quienes participaron en la acción, pero además, se especifica que se hace una adecuación a las realidades de los participantes, ya que en el caso de la comunidad El Estoraque del cantón La Laguna, por sus particularidades, se realizó el

proyecto avícola, valorando que ya existía la crianza de estos animales, pero que se hacía sin técnica y solo para efectos alimentarios inmediatos.

La asistencia técnica sin duda mejoró significativamente las prácticas de las personas, pero además, proporcionó una mejora en cuanto a la forma en que la comunidad logró emplazar su acciones de forma organizada y solidaria.

Grupo focal sobre el impacto en el componente de salud y nutrición del proyecto

Con la Lic. Emilia tuve una experiencia en como dale verduras a los niños en la comida ella nos enseñó hacer para revolver en la comida las verduras y así hicimos que los niños comieran, la elaboración de fresco de encaparían para darle a los niños (Comunidad La Presa).

En la salud, en la atención y desarrollo de ellos, la niña Emilia ha tenido cuidado varias veces en las tallas y peso de los niños si uno de los niños pierde peso ella está viendo que hacer para que lo vuelva a ganar, las capacitaciones que nos ha dado para saber cómo ayudar a las demás, hemos aprendido a trabajar unidos, el proyecto en la comunidad ha ido en beneficio en beneficio (Comunidad La Laguna) .

Con esto se nos da las ideas de cómo hacer para medir, tallar, pesar a ellos, ya tenemos experiencia para poder a prueba nosotros mismos y así poder traer más personas en el proyecto porque ya tenemos las capacidades para eso (Comunidad El Rodeo).

Con la cuestión de salud el beneficio fue grande. Muchos niños estaban desnutridos y también las mujeres mas que todos los embarazadas, pero la Licda. Emilia le dedicaba a esto y ya hoy, vemos mejor a los niños, las mujeres tuvieron sus hijos y se ven sanitos (Comunidad El Rosario).

En la participación en el grupo focal por parte de miembros de las comunidades beneficiadas con el proyecto, hicieron mención a importante cambios que ocurrieron para transformar sus modos de vida, particularmente en lo relacionado con la salud y nutrición. Siendo un cambio importante, la mejor de una alimentación, ya que se introdujeron dietas saludables con los mismos alimentos que ellos producen, entre los cuales figuran las verduras a las cuales se le dio técnica para que las niñas y los niños puedan consumirlas; también destacaron el uso de instrumentos para tallar y pesar, que les permiten ir monitoreando el avance de la nutrición en la población.

Entrevistas al equipo técnico, con respecto al componente de salud y nutrición

Se dio una reducción en la desnutrición en los niños, la paternidad responsable, se les enseñó métodos para cuidar bien a los niños en su desarrollo, se involucró los padres en llevar a los niños a los controles de salud ya la carga no solo le cae a la madre el padre también los lleva, reconocer que la misma comunidad tiene gente capacitada para poder coordinarse entre ellos e instituciones para que lleven medicina y ayuda para los niños.

Fue importante destacar que aunque la desnutrición no se presentaba en muchos casos de forma como la mide el ministerio de salud, si habría riesgos en muchos casos, a los cuales se les dio seguimiento y han mejorado significativamente. De igual manera a las mujeres embarazadas y a las madres lactantes.

El equipo valoró significativamente el cambio que se ha generado con la introducción del proyecto en el tema de salud y nutrición, ha sido significativo a tal grado que se puede decir que se ha cumplido con lo planeado, sin embargo, según lo expresado por el equipo técnico en un principio no fue fácil la tarea, ya que la información estadística disponible no reflejaba claramente la situación de las comunidades, haciéndose ver que no existían una desnutrición como tal, sin embargo, al revisar las evidencias recolectadas se pudo mostrar que existía riesgos nutricional, pero no bajo la consideración de lo expresado en los estándares del ministerio de salud.

La intervención por lo tanto, permitió reducir el riesgo de desnutrición y a quienes se les identificó un estado de desnutrición severa, se les trató adecuadamente y se han ido recuperando, de tal manera que se logró aproximar a un contexto donde se favorece la búsqueda de una salud oportuna y con alcance a la población.

En el establecimiento de salud del municipio del Congo, la responsable de enfermería al ser consultada expresó claramente que *“el proyecto fue importante porque permitió que a la gente se le llevara salud y con eso, muchos niños, niñas y mujeres se vieron favorecidos por la atención directa y un cuidado más especial”*. Como se expresa si existió un impacto significativo en el proyecto que derivó hacia la construcción sólida de una acertada estrategia de trabajo territorial en función de beneficiar a las comunidades y dejar una condición de desarrollo para el futuro.

Viabilidad y sostenibilidad del proyecto

Esta referido al grado en que los efectos positivos derivados de la intervención se mantienen y continúan una vez retirada la ayuda externa.

Este indicador es uno de los más elementales para la evaluación y consiste en valorar si para se construyeron bases sólidas para que el proyecto al finalizarse el financiamiento, pueda continuar con sus componentes principales para seguir dándole viabilidad y sostenibilidad a éstos e inclusive ampliarse para que la cobertura será aún más amplia.

Grupo focal con comunidades

La verdad si se puede, pero a saber en verdad, ya que la comunidad es grande y el proyecto cubrió el 25% de las familias, esto puede afectar en intentar ponerlo a práctica pero con trabajo de todo si se puede poner en marcha.

Aquí existe la costumbre de dejar las oportunidades a un lado, la participación no le gusta a toda la comunidad, en los compromisos no les gusta hacerlos, hay falta de asistencia técnica para poder ayudar a la comunidad sería bueno que continúe la ayuda en eso (Comunidad La Presa).

Lo que aprendimos aquí, claro que lo podríamos aplicar nosotros, eso sí, no faltaría de más que de vez en cuando nos visitaran porque las cosas técnicas no las manejamos del todo y siempre hay duras, pero creo que estamos organizados como comunidad y podríamos hacer algo (Comunidad La Laguna)

-Si se puede poner en marcha, porque ya tenemos la capacidad de poder unir nuevos miembros beneficiarios en el proyecto. Lo que aprendimos se debe de poner en práctica con los demás, se debe de compartir todos esos conocimientos para que se tenga una unión entre todos y el proyecto funcione más adecuado.

-Lo más importante que se nos entrego fue el conocimiento, este no lo teníamos ahora sí y se le puede pasar a más personas de la comunidad para que ellos también las ponga aprueba (Comunidad El Rodeo).

Aprovechar las capacitaciones que nos dieron debemos de aprovecharlo, aprovecharlo en la práctica, nosotros mismos haciendo que mejores cada día más y así, podríamos seguir adelante, a pesar que siempre es necesario el apoyo técnico (Comunidad El Rosario).

Al consultar con las comunidades sobre el tema de la sostenibilidad de la acción, se puede destacar que consideran en buena parte que si podrían continuar, ya que han recibido la parte más importante que es el conocimiento, sin embargo valoran que la asistencia técnica no estaría de más que se diera algún seguimiento para aportes posteriores, pero se han podido construir bases organizativas para ejercer los componentes de la acción.

Entrevistas a líderes de las comunidades

Si, es necesario porque es una gran ayuda pero si continua la fundación seria mucho que mejor porque se podría influir en más ayuda y en más personas (Lideresa y ama de casa, comunidad El Rodeo).

Si, se debe seguir implementando estas acciones aunque no esté ya la fundación se debe de continuar con la creación del huerto comunitario, dar la distribución de semilla para motivar a la gente a que continúe en el proyecto (Líder y agricultor, comunidad, La Presa)

Si creo que podríamos seguir, ellos nos han dejado el conocimiento, ahora nos toca a nosotros ponerlo en práctica, por supuesto, no sería fácil pero debemos ponerle ganas. No sería malo, que talvez de en cuando nos visitaran para darnos una espiada a ver si las cosas las estaremos haciendo bien (Líder y agricultor, comunidad El Rosario).

Igual, con el apoyo de los técnicos para que funcione, porque sin ellos nos costaría más darle continuidad. y Quizás incluyendo una incubadora eléctrica para empollar los huevos. Porque las gallinas pasan mucho tiempo poniendo y a veces no encontramos que hacer con los huevos. Y eso ayudaría más a la comunidad porque otras personas que no están en el proyecto podrían beneficiarse con estos (Lideresa y ama de casa, comunidad La Laguna)

Al considerarse el tema de la viabilidad y sostenibilidad del proyecto al finalizar éste, los líderes de las comunidades expresaron que existen condiciones para poder seguir ejecutando las acciones y componentes del mismo, ya que se tiene una organización comunitaria que los respalda, pero también el conocimiento ha sido asimilado y puesto en acción en la ejecución de la actividades, además, hicieron notar la formación de “consejeras y consejeros nutricionales voluntarios” que son parte de las capacidades técnicas.

Otro componente importante es el “banco de semilla” que se constituye en un significativo aporte a la comunidades, ya que proporcionará las bases para que se garantice una soberanía en cuanto a la producción de alimentos de calidad y a un costo adecuado a las condiciones de vida de los habitantes de estos sectores, con lo cual se estaría dando paso a una acción significativa del trabajo comunitario.

Todo esto también se articular como un elemento fundamental para la sostenibilidad de esta acción con el marco de la política municipal de seguridad alimentaria, ya que es el soporte gubernamental que permitirá a partir de su formulación y ejecución, buscar la garantías para la búsqueda tanto de un atención al problema como también, a afrontar el cambio climático.

Con la política se pretende coordinar las estrategias con la municipalidad para poder llegar, no solamente el proyecto así por así sino que haya un mayor respaldo, avance, que abarque un poco más. Que la alcaldía ponga también su parte para poder llegar a las familias que más lo necesita. La Alcaldía es la que está más al tanto de todo (Coordinador de la unidad de gestión de riesgos, alcaldía municipal de El Congo)

El responsable municipal considera en buena parte que con las estrategias contenidas en la política municipal de seguridad alimentaria, se puede propiciar las bases para la continuidad de las acciones, pero de mayor relevancia su extensión a otros territorios del municipio.

Grupo focal técnicos del proyecto

En el tema de seguridad alimentaria la idea era que la alcaldía asumiera con un técnico en la comunidad, pero buscando alternativas el CENTA asigno a un técnico para que el agrupara a las familias y les siguiera apoyando como lo hemos hecho, además dentro de la misma comunidad se encuentra la capacidad de regularse por ejemplo en le banco de semilla ay un encargado en la distribución de ella ósea ay una organización

Hay ya personas organizadas dispuestas a trabajar por la comunidad estas son los voluntarios que forman parte de mucho de las acciones que se han hecho en el territorio, esas personas tienen conocimientos, material, equipos, pueden ya replicar las acciones que nosotros hicimos.

La parte técnica del proyecto consideraron que si existen las condiciones para la viabilidad y sostenibilidad del proyecto y sus componentes, siendo su principal soporte, las personas que han sido capacitadas en las comunidades y los insumos que ya se dejaron para que se continúe con este importante esfuerzo de trabajo que ha beneficiado e impactado positivamente a las comunidades en cuestión.

LECCIONES APRENDIDAS

Todo proceso humano es perfectible, por ello es necesario evaluar cada acción y proceso que se realiza, para poder dilucidar mejoras a los procesos que conforman estas dinámicas. Por ello a continuación se detallan algunas situaciones que podrían valorarse como lecciones para otros proyectos.

Una lección que se señaló con suficiente énfasis es el tema del tiempo, ya que se valoró que la duración del proyecto que fue de un año, las acciones se ajustaron con tal precisión en el tiempo que se saturaron, provocando que se sobrecargaran los recursos y no se diluyeran las cosas tal y como deberían ser.

En lo administrativo, se remarcó que por ser primer ocasión en la cual se manejaba este tipo de proyectos, se tuvo que adecuar los roles administrativos a las exigencias del ente financiador, lo que condujo en un par de casos a que los tiempos no se cumplieron efectivamente como lo planeado, sin que esto desmereciera el logro de los objetivos.

En la parte técnica, se complicó la participación con 190 familias al mismo tiempo, con un solo recurso, por componente ya que por momento no se lograba cubrir plenamente las actividades, sin embargo se hicieron los esfuerzos porque no se descuidara ningún beneficiario, por lo que debería valorarse la cantidad de la población implicada para poder hacer el trabajo acorde a esta cantidad de recursos humanos – beneficiados.

Con el tema de la unidad de salud se debe manejar las jornadas médicas más accesibles para que el personal de salud esté disponible y en cuanto a los medicamentos, considerarse que hoy en día el proceso para utilizarlos conlleva a una serie de pasos externos que puede propiciar una burocracia que si no se hace con suficiente tiempo retardaría las actividades según lo planeado.

Con relación a las municipalidades, hay que tomar en cuenta la volatilidad política, ya que se debe ser permisivo en el trabajo de territorio con este ente, el cual tiene confluencias que de una u otra manera, al no ser manejadas adecuadamente puede estropear lo planeado y no lograr cumplir con los objetivos planeados.

CONCLUSIONES

En función a cada de los resultados que han sido expuestos durante este informe, con base a la evidencia tanto documental como oral que se recopiló y en función a los indicadores de impacto, se pueden llegar a la siguientes conclusiones, a saber:

- El proyecto realizado era pertinente al entorno, ya que se evidenció la necesidades asistir a la mejorar de las prácticas de las personas. El derecho a la seguridad alimentaria de estas poblaciones era deficiente y el acceso a medios de vida reducido, por ello las acciones ejecutadas conllevaron mejorar este problema, además, la salud y nutrición como consecuencias de una mejora del acceso a los medios fue evidente.
- El equipo del proyecto optimizaron eficientemente los recursos, lo cual permitió que se lograra llegar a cada beneficiario de la mejor manera, además, esto aportó a que los componente fuera acertadamente estimulados para lograr los resultados previstos.
- La eficacia del proyecto en cuanto a la relación entre los objetivos y los resultados previstos fue significativa, por lo cual se puede valorar que las acciones ejecutadas tuvieron coherencia en la articulación planeación-ejecución. Esto permitió que los beneficiarios del proyecto, pudieras acceder oportunamente a los componente destinados para su transformación.
- Se puede enunciar que el impacto del proyecto fue positivo, en el sentido que se evidenciaron con base a la opinión de las comunidades y medio de verificación valorados, que si hubieron cambios sustantivos provocados por la intervención del equipo técnico. Antes del proyecto no había una política municipal de seguridad alimentaria, que será de aquí en adelante la base sobre la cual se oriente la acciones para el municipio; la desnutrición era parte de la situación de la niñez y las mujeres embarazadas, ahora con el proyecto se ha disminuido estos indicadores y estos grupos se encuentran en atención continua; y además, con la intervención del proyecto los

agricultores tiene práctica que aportaran a que su producción sea más eficiente y generen reducción en los costos económicos, pero también mas amigables con el medio ambiente y las búsqueda de una sustentabilidad.

- Con respecto a la viabilidad y sostenibilidad, se debe mencionar que este indicador es más relevante y al considerar lo evidenciado en el proyecto, se logró identificar elementos suficiente para la atención de esta temática, ya que las comunidades se han organizado alrededor de los componentes del proyecto y por ello tienen las capacidades instaladas continuar con el aporte del proyecto, sin embargo, se estableció una sinergia de trabajo, con la cual los beneficiarios han mostrado simpatía con el equipo técnico y solicitado su continuidad, en vista de una relación cordial y efectiva en la ejecución del proyecto.

Estos elementos anteriores permiten valorar que los indicadores muestran una importante nivel de cumplimiento, por lo cual se puede decir que alcance del proyecto logró ser de impacto positivo para las comunidades, además hay otros ejes que fueron de vital importancia y que se deben mencionar.

El proyecto mantuvo un enfoque de género durante todo su proceso y que también incidió en transformar las mentalidades de la población. Cuando se consultó sobre dichos cambios, los grupos fueron muy explícitos en mencionar que el proyectos les permitió cambiar sus concepciones sobre los roles al interior de la familia y como podrían compartirlos, al mismo tiempo de respetarse y apoyarse. Estos aporta una crecimiento fundamental para estas comunidades, que tendrán una mejora en su calidad de vida, no solo por un hecho material, sino espiritual en la medida en que se mediatiza este tipo de relaciones que anteriormente se veían influenciadas negativamente.

Por último, mencionar que si se evidenció una conciencia hacia el tema del cambio climático, algo lo cual mostraron una preocupación pero, con el proyecto se identificaron en función a construir la resiliencia para afrontarlo y aunque su integralidad conlleva a esfuerzos compartidos, no cabe duda que ya tiene si aporte par la construcción de ese marco de acción para hilvanar los esfuerzo por hacer frente a este fenómeno de latitudes mundiales, pero que territorialmente, debe afrontarse con prácticas como las aprehendidas.

RECOMENDACIONES

El proyecto realizado tuvo un importante impacto en las comunidades beneficiarias, algo que ya se ha mostrado, por ello a continuación se enuncian las siguientes recomendaciones que podrían tomarse en cuenta para efectos de valorar futuras acciones o reflexionarse para efectos de mejorar las prácticas en estos contexto.

- Es necesario valorar la posibilidad de más recurso humano para atender a componentes de trabajo extensos, ya que si bien se logró salir adelante y tener resultados favorables, la carga laboral concentrada en el equipo técnico fue vasta por ello se debe adecuar la relación entre la población y las capacidades humanas.
- Con el proyecto se apertura una importante ruta de trabajo con los entes públicos, particularmente con la municipalidad y la unidad comunitaria de salud familiar; ambas relaciones si se lograr articular, pueden darle un soporte más efectivo a la sostenibilidad de las acciones, pero es pertinente continuar la comunicación y hacer efectivo la articulación de esfuerzos futuros con estas comunidades.
- El trabajo en el territorio dejó un importante grupo de personas voluntarias con la disposición de ayudar a su comunidad, esto debe ser un capital humano que hay potenciarlo, sobre todo quienes tiene aspiraciones de superación, por ello se recomienda establecer alianzas con otras entidades para contar con programas extensivos en el área educativa, para que muchos jóvenes que ahí se encuentran puedan superarse académicamente y aportar así, más desarrollo a sus comunidades.
- Por último, si bien el proyecto ha finalizado, se debe darle un seguimiento técnico, que estimule a las personas que han quedado responsables a seguir, con lo cual no es necesario la asistencia financiera, sino más bien la parte motivacional y el aporte también, de conocimientos que se vayan mejorando. Esto en vista, que aunque la acción ha finalizado, pero se dejó un vinculo importante al cual con atención se le puede dar una viraje estratégico que territorialmente incidía en todo el municipio del Congo.

ANEXOS

Fotografías



Reunión con líderes de la comunidad El Rodeo



Reunión con líderes de la comunidad La Presa

Evaluación ex-post del proyecto “familias fortalecen su soberanía alimentaria nutricional con sistema productivos resilientes e incluyentes en el municipio del Congo”



Reunión con líderes Comunidad El Rosario



Reunión con líderes comunidad La Laguna.

